
Kristianstads teater, entré med garderob och foajé

Kristianstads Kommun · 2026



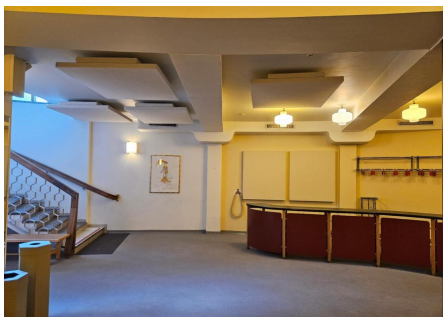


ÅR
2026

PROBLEM


Lång efterklangstid vid alla frekvenser.

ÅTGÄRD

10 st	Corner Palett Diagonal
10 st	Ovan SPECIAL: 540x1200
14 lpm	Qwiz Tyg Vit 100. 2 mm
16 st	Hörn Diagonal Acqwool Vit 100
4 st	Fyrkant Stor Bas Natur 111 t=100 mm
2 st	Hörn Acqwool Dubbel Ljusgrå 201
46,8 m²	Master
46 st	Fyrkant Bas tak med diktbyglar
22 m²	Parafon Buller 100mm A
16 m	Akustikduk Vit B=1800 mm
2 Set	Singel Tak 0,9 x 3,00 m
2 Set	Singel Tak 0,9 x 4,80 m

RESULTAT

Efterklangstid i sekunder per oktavband (Hz)

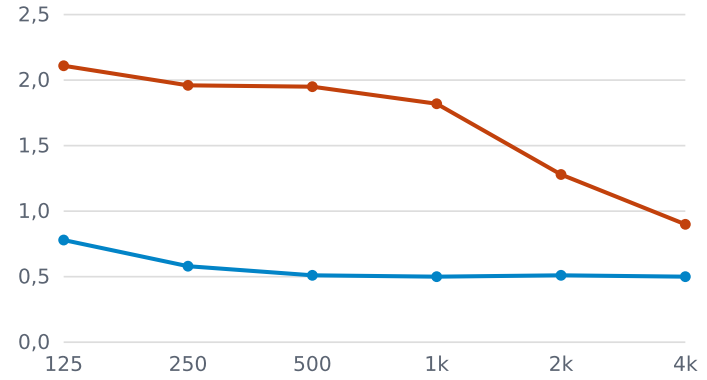

Hz	125	250	500	1k	2k	4k
Före åtgärd	2,11	1,96	1,95	1,82	1,28	0,90
Uppmätt efter	0,78	0,58	0,51	0,50	0,51	0,50

Godkänt av kund
